



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA

PGP – PLANO GERAL DE PROJETO

1 Identificação do Projeto

Projeto Integração camuflada da denúncia de violência contra a mulher dentro do site do TRE-BA	
Demandante SGPRE (Thais Habib)	Data da Elaboração 26/04/2021
Cliente Sociedade em geral.	
Patrocinador André Cavalcante	
Gerente do Projeto Thais Habib	Lotação do Gerente Secretaria-Geral da Presidência
E-mail do Gerente do Projeto mthabib@tre-ba.jus.br	Ramal do Gerente do Projeto 9158/7003
Programa vinculado	

2 Visão Geral do Projeto

2.1 Justificativa do projeto

Dentre os valores organizacionais priorizados pelo TRE-BA, a responsabilidade social apresenta-se como essencial para minimizar a distância entre o TRE-BA e a sociedade, tornando necessária a implementação de ações que demonstrem a preocupação do Órgão com o desenvolvimento social, possibilitando a melhoria de sua imagem enquanto Instituição responsável perante a comunidade.

Com esse propósito e respaldado pela Recomendação CNJ nº 67/2020, o projeto “Integração Camuflada” tem por objetivo viabilizar o registro eletrônico (on-line) de ocorrência de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, através do envio de denúncia mediante acesso, pela vítima, a sistema deste Regional que esteja interligado à rede da Polícia Civil do Estado da Bahia (Delegacia Digital).

Outrossim, impende destacar que a presente iniciativa se coaduna com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - ODS nº 5 da Agenda 2030 da ONU no que toca a adoção de ações com vistas a eliminar todas as formas de violência contra as mulheres.

2.2 Objetivo do Projeto

Possibilitar o registro “camuflado” de denúncia de violência contra a mulher, viabilizando que este seja feito através do acesso ao site do TRE-BA, que, uma vez adaptado às exigências da Delegacia Digital da SSP/BA, possibilite o direcionamento da denúncia à Polícia Civil do Estado da Bahia para regular apuração.

Ressalte-se que, após o “registro camuflado” em sistema do TRE-BA, todo o encaminhamento e acompanhamento da denúncia deverá ocorrer através do site www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br.

2.3 Objetivos Estratégicos

No âmbito deste Tribunal, o Projeto “Integração Camuflada da denúncia de violência contra a mulher” poderá contribuir para o alcance dos seguintes objetivos estratégicos:

- Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à sociedade
- Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis

2.4 Objetivos Específicos

- Desenvolver sistema ou adaptar sistema já existente para promover o suporte necessário ao Projeto “Integração Camuflada da denúncia de violência contra a mulher”.
- Permitir a integração com o sistema específico da Secretaria de Segurança Pública (SSP) de forma a viabilizar o repasse das denúncias formuladas.
- Disponibilizar um canal silencioso, permitindo que mulheres em situação de violência se identifiquem nesses locais e, a partir daí, formalizem denúncia e sejam tomadas às devidas providências.

3 Escopo do Projeto


3.1 Dentro do Escopo

- Fornecer um canal seguro a fim de contornar a dificuldade de denunciar os agressores.
- Implantar ou adaptar sistema específico para viabilizar o compartilhamento de informações com a SSP.
- Planejar a capacitação dos agentes envolvidos
- Formalizar acordo de cooperação com a SSP visando a consecução dos objetivos

3.2 Fora do Escopo

- Receber denúncias de violência contra mulheres.
- Tratar denúncias de violência contra mulheres no âmbito da justiça eleitoral.

3.3 Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

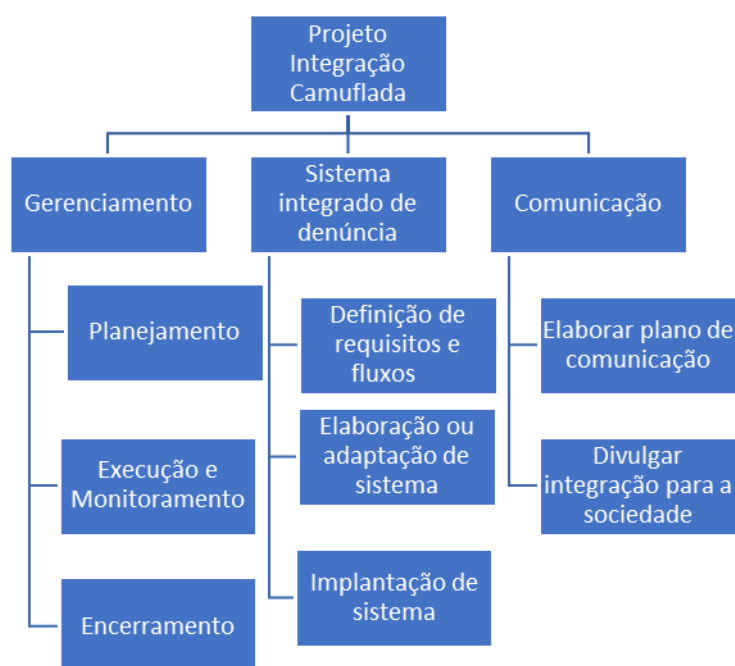

4 Cronograma detalhado

{Desenvolver o cronograma do Termo de Abertura, até o nível de atividades}

Etapas	Cronograma		Predecessoras	Interface	Responsável
	Início	Término			
Fase 0: Gerenciamento	22/06/2021	dd/mm/aaaa			
0.1 Planejamento	22/06/2021	05/07/2021			Gerente do Projeto
0.1.1 Elaborar PGP	14/06/2021	22/06/2021			Gerente do Projeto
0.1.2 Submeter PGP à aprovação	23/06/2021	30/06/2021			COPEG
0.1.3 Aprovar PGP	01/07/2021	05/07/2021			DG
0.2 Monitoramento e Controle do projeto	06/07/2021	06/08/2021	0.1		Equipe do Projeto
0.3. Encerramento do Projeto (Elaborar e formalizar TEP)	06/07/2021	10/07/2021	0.2		Equipe do Projeto
Fase 1: Levantamento de requisitos	29/06/2021	13/07/2021	Fase 0		
Requisitos funcionais:	29/06/2021	05/07/2021			
Reunião entre desenvolvedores e clientes	29/06/2021	29/06/2021			Time do projeto
Elicitação dos requisitos	29/06/2021	05/07/2021			Time do projeto
Prototipação	06/07/2021	09/07/2021			
Construção de protótipo não funcional	06/07/2021	08/07/2021			Time do projeto
Reunião de apresentação e validação do protótipo	09/07/2021	09/07/2021			Time do projeto
Requisitos não funcionais:	09/07/2021	13/07/2021			
Reunião com equipe técnica da SSP	09/07/2021	13/07/2021			Time do projeto
Fase 2: Implementação	14/07/2021	06/08/2021			
Definição da Arquitetura e documentação	14/07/2021	15/07/2021			Time do projeto
Codificação	16/07/2021	30/07/2021			Time do projeto
Testes	02/08/2021	02/08/2021			Time do projeto
Ajustes	03/08/2021	03/08/2021			Time do projeto
Fase 3: Homologação	04/08/2021	06/08/2021			
Validação pelo cliente	04/08/2021	05/08/2021			Demandante

Correções, se houver	06/08/2021	06/08/2021			Time do projeto
Fase 4: Liberação e Implantação	06/08/2021	06/08/2021			
Colocar solução em produção	06/08/2021	06/08/2021			Time do projeto

Fase: conjunto de atividades do projeto logicamente relacionadas, normalmente concluída com a entrega de produto ou serviço específico. Por exemplo: cadastro eleitoral, licitação;

Entrega: qualquer saída, resultado ou item mensurável, tangível e verificável que deve ser obrigatoriamente produzido para concluir um projeto ou parte de um projeto.

Atividade: todas as ações necessárias para que a Entrega seja realizada.

Predecessora: etapa (fase, entrega ou atividade) anterior cujo cumprimento é requisito para o início da etapa de referência.

Interface: meio capaz de promover a interação entre duas ou mais fases, entregas ou atividades.

5 Plano Orçamentário

{Informe os custos com aquisições necessárias para cada entrega, se houver.}

Entrega	Recurso	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Não se aplica				

6 Organização do Projeto

6.1 Áreas impactadas

Unidade Interna Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
STI	Desenvolvimento ou adaptação de sistema específico. Suporte para utilização do sistema Tratativas cm a SSP para operacionalizar a tarefa	André Luiz Cavalcanti e Cavalcante
ASCOM	Divulgação	Felisberto da Silva Bulcão Filho
Unidade Externa Impactada	Descrição do Impacto Previsto	Gestor da Unidade
SSP	Recepção de denúncias, mediante integração de sistema da Justiça Eleitoral	

6.2 Equipe do Projeto

Nome	Unidade	Ramal	E-mail
Maria Thais Habib Pinheiro	SGPRE	7003	mthabib@tre-ba.jus.br
André Luiz Cavalcanti e Cavalcante	STI	7117	alcavalcante@tre-ba.jus.br
Felisberto da Silva Bulcão Filho	ASCOM		fsfilho@tre-ba.jus.br

7 Premissas e Restrições

- Apoio da alta-administração;
- Envolvimento das unidades e servidores do TRE-BA relacionados ao projeto;
- Apoio da SSP

8 Plano de Resposta aos Riscos

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Sistema não ficar pronto tempestivamente	Atraso na implantação do projeto	() 1-Muito Baixo (X) 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto () 5-Muito alto	() 1-Muito Baixo () 2-Baixo () 3-Médio (X) 4-Alto () 5-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Buscar sistemas alternativos já em funcionamento em outros órgãos públicos			

Causa raiz do risco	Efeito	Probabilidade de acontecer	Impacto
Falta de disponibilidade da equipe de TI para desenvolvimento do sistema	Atraso na entrega dos produtos do projeto	(X) 1-Muito Baixo () 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto () 5-Muito alto	(X) 1-Muito Baixo () 2-Baixo () 3-Médio () 4-Alto () 5-Muito alto
Plano de Resposta			
Ações	Data limite	Responsável	Área
Negociar priorização do projeto		André Cavalcante	STI

9 Aprovações

Elaborado ou Revisado por	Data	Assinatura
Thais Habib	22/06/2021	

De acordo da Unidade solicitante e das Unidades impactadas	Data	Assinatura
Thais Habib		
André Cavalcante		
Felisberto Bulcão		

Revisado (SEGOVE)	Data	Assinatura

Aprovado (Diretoria-Geral)	Data	Assinatura
